


II -13. 钢架构主体作业

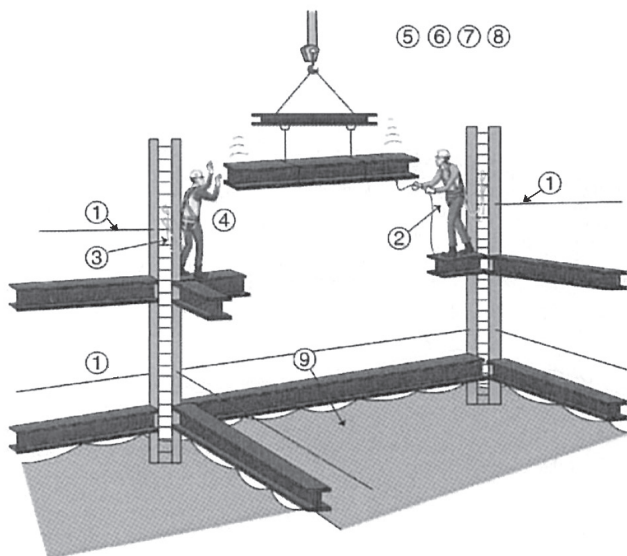

- 1 是否有主绳？
主绳支柱的间隔是否小于 10m ？
- 2 作业员是否使用了安全带？
- 3 升降时，是否使用主绳及安全索？
- 4 是否携带工具袋？
- 5 给予起重机操作员的手势指挥是否得当？
- 6 主体建设是否依照主体建设计划及作业步骤切实进行？
- 7 是否任命了作业主管或作业指挥员？
- 8 是否有禁止入内的路障、警戒绳、告示牌？
- 9 是否有安全网？
