


II-3. 开口处周边作业

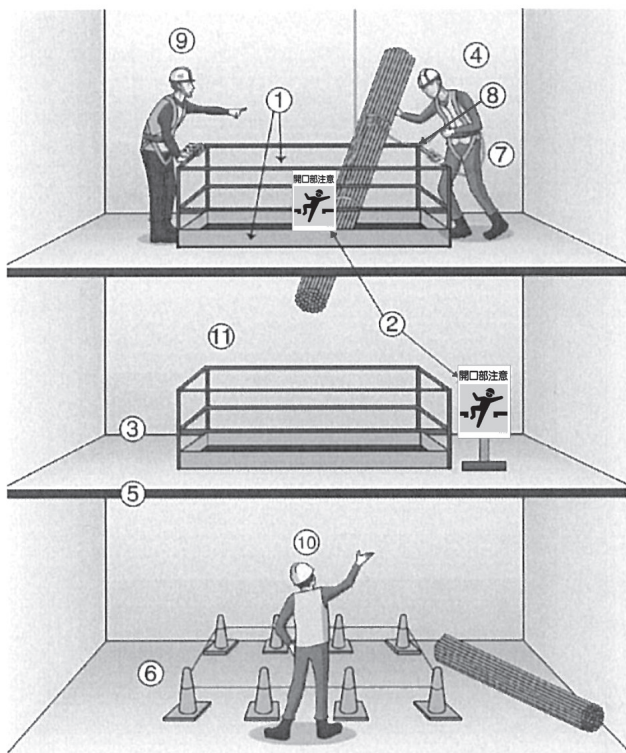

- 1 是否设有高 90cm 以上的扶手？
是否安装挡脚板？
- 2 是否有开口处注意标识？
- 3 开口处周边是否经过仔细整理整顿？
- 4 是否选择适当场所吊、放材料？
- 5 是否上下同时作业？
- 6 是否设置有路障？
- 7 卸下建材时是否使用安全带？
- 8 长尺寸物品是否使用辅助绳？
- 9 起吊货物作业时是否有作业指挥？
- 10 起重机的吊装作业是否由持有相关资格证书的人员操作？
- 11 是否使用水平安全网？
