


II-3. Lỗ mở sàn

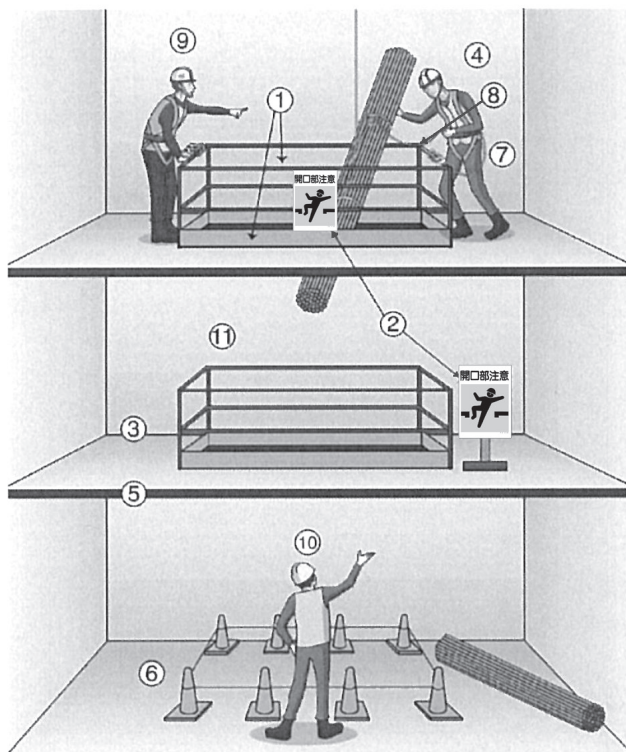

- 1 Có bố trí lan can với chiều cao 90cm hoặc hơn?
Có bố trí tấm chắn dưới chân đứng?
- 2 Có bảng cảnh báo lỗ mờ sàn?
- 3 Có dọn dẹp sạch sẽ chung quanh lỗ mờ?
- 4 Có bố trí khu vực thích hợp để nhận và tải vật liệu lên xuống quanh lỗ mờ sàn?
- 5 Có nhiều tầng công nhân đang hoạt động cùng lúc trên lỗ mờ?
- 6 Có lắp giàn chắn khu vực thi công quanh lỗ mờ?
- 7 Có dây đai an toàn trong khi tiếp nhận vật liệu từ lỗ mờ?
- 8 Có dây định hướng vật liệu loại dài?
- 9 Có công nhân giám sát việc nâng hạ vật liệu ?
- 10 Các công nhân điều tiết dây cáp có được huấn luyện phụ hợp?
- 11 Có lưới chắn an toàn giăng ngang không?
