


III – 2. Pekerjaan Menahan Tanah

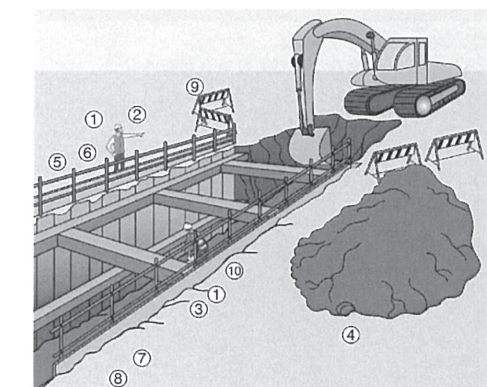

- 1 Apakah Pengawas sudah ditentukan untuk aktivitas kerja penggalian dengan kedalaman lebih dari 2m?
- 2 Apakah sudah dilakukan pemeriksaan terhadap retakan dan batuan yang berpotensi longsor?
- 3 Apakah rencana penyanggaan sudah direview?
- 4 Apakah tanah sisa galian dikumpulkan pada jarak aman?
- 5 Ketika galian lebih dari 1,5 M apakah ada penyangga dan handrail?
- 6 Apakah papan penyangga dipasang lebih awal?
- 7 Apakah Pengawas untuk pekerjaan menyangga (shoring) sudah ditentukan?
- 8 Apakah kondisi tanah sudah diperiksa sebelum dilakukan pekerjaan?
Apakah kondisi tanah sudah diperiksa pasca hujan lebat dan gempa bumi?
- 9 Apakah tersedia barikade dan rambu Dilarang Masuk?
- 10 Apakah tersedia tangga/ akses?
