


## Ⅱ-13. 鉄骨建て方作業

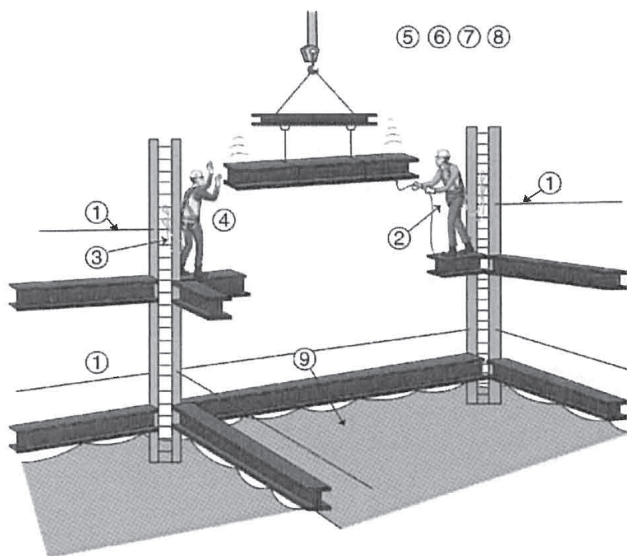

- 1 親綱はあるか？  
親綱支柱の間隔は10m以下か？
- 2 作業員は安全帯を使用しているか？
- 3 昇降時には、親綱とロリップを使用しているか？
- 4 道具袋を持っているか？
- 5 クレーンオペレーターとの合図方法は適切か？
- 6 建て方は、建て方計画及び作業手順に基づき適切に行っているか？
- 7 作業主任者又は作業指揮者は、任命されているか？
- 8 立ち入り禁止のバリケード、ロープ、看板はあるか？
- 9 安全ネットはあるか？
