


VII-4. Máy liên kết bu lông

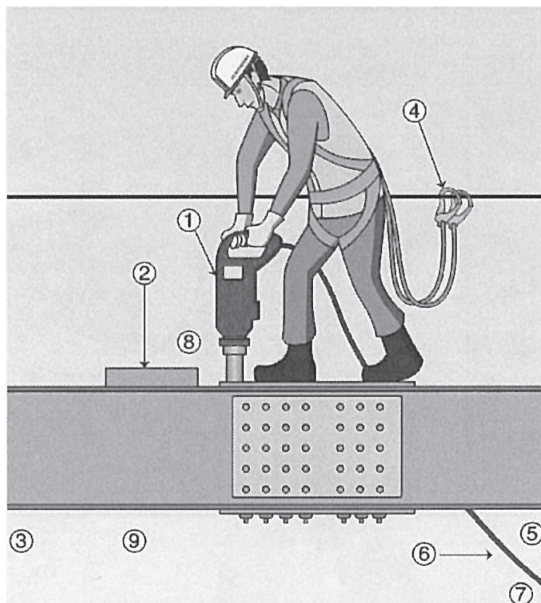

- 1 Máy móc được kiểm tra để xác định máy có quay không tải hay quay ngược không?
- 2 Các dầm thép được làm sạch và rõ ràng tại các điểm liên kết?
Các con tán bu lông được lưu trữ trong hộp?
- 3 Bu lông cường độ cao có được sử dụng như bu lông tạm để siết chặt tạm thời không?
- 4 Công nhân sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ lao động?
- 5 Có kéo dây cáp cabtyre quá sức không?
- 6 Dây cáp cabtyre có bị hư hại không?
- 7 Có hệ tiếp đất cho máy gần đó?
- 8 Kích thước của các nút vận có được xác định phù hợp?
- 9 Có người nào ở phía dưới của người làm việc trên cao không?
